


Vergabeermächtigung

Ablauf Auftragsvergabe

Projektentscheidung

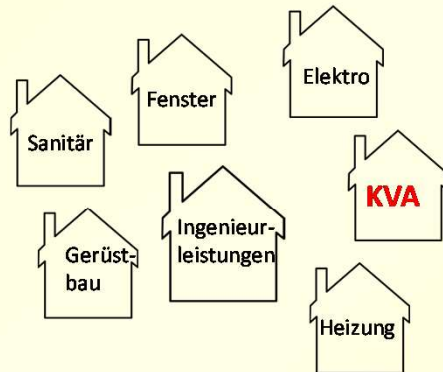


→ Vergabe Planungsleistung
Kostenvoranschlag
Ausschreibung
Submission
Vergabe der Einzelgewerke (ab 60.000€ im HA; ab 650.000€ im SR)
Einzelentscheidung/Gewerk/Tagesordnungspunkt

→ zeitliche Bindung an Ratsbeschluss/Sitzungstermin

Vergabeermächtigung

Projektentscheidung

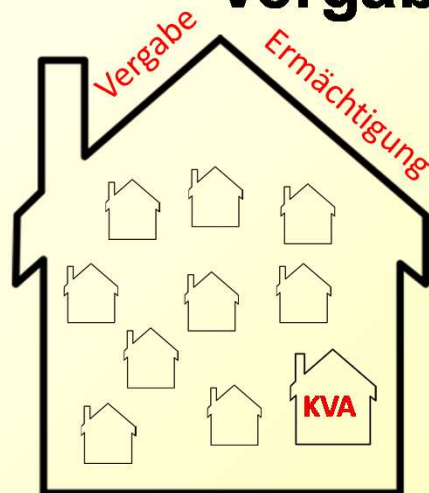


→ Gesamtkostenschätzung nach §3 VGV
Vergabeermächtigung für Gesamtmaßnahme(HA/SR)
Standardisierter Inhalt, siehe BV
Kontrollmechanismen/Mitzeichnungsrechte bleiben erhalten
regelmäßige Sachstandsmitteilungen

→ Aufträge können flexibel vergeben werden, abgekoppelt vom Sitzungstermin, Optimierung des Bauablaufs


Rahmenbedingungen

- **Die Vergabeermächtigung nimmt dem Rat/Gremium keine Rechte**
- **Sie räumt dem Rat eine weitere Möglichkeit ein (siehe Hauptsatzung)**
- **Die Vergabeermächtigung ist gesetzes- und rechtskonform**
- Der Entscheidungsspielraum ist im Vergaberecht stark eingengt
- Informationsfrequenz bestimmt Rat (Vorschlag: quartalsweise)
- Karenz von 20 % als Diskussionsgrundlage
- Testphase: 1 Jahr

Ablauf und Beteiligung des Rates

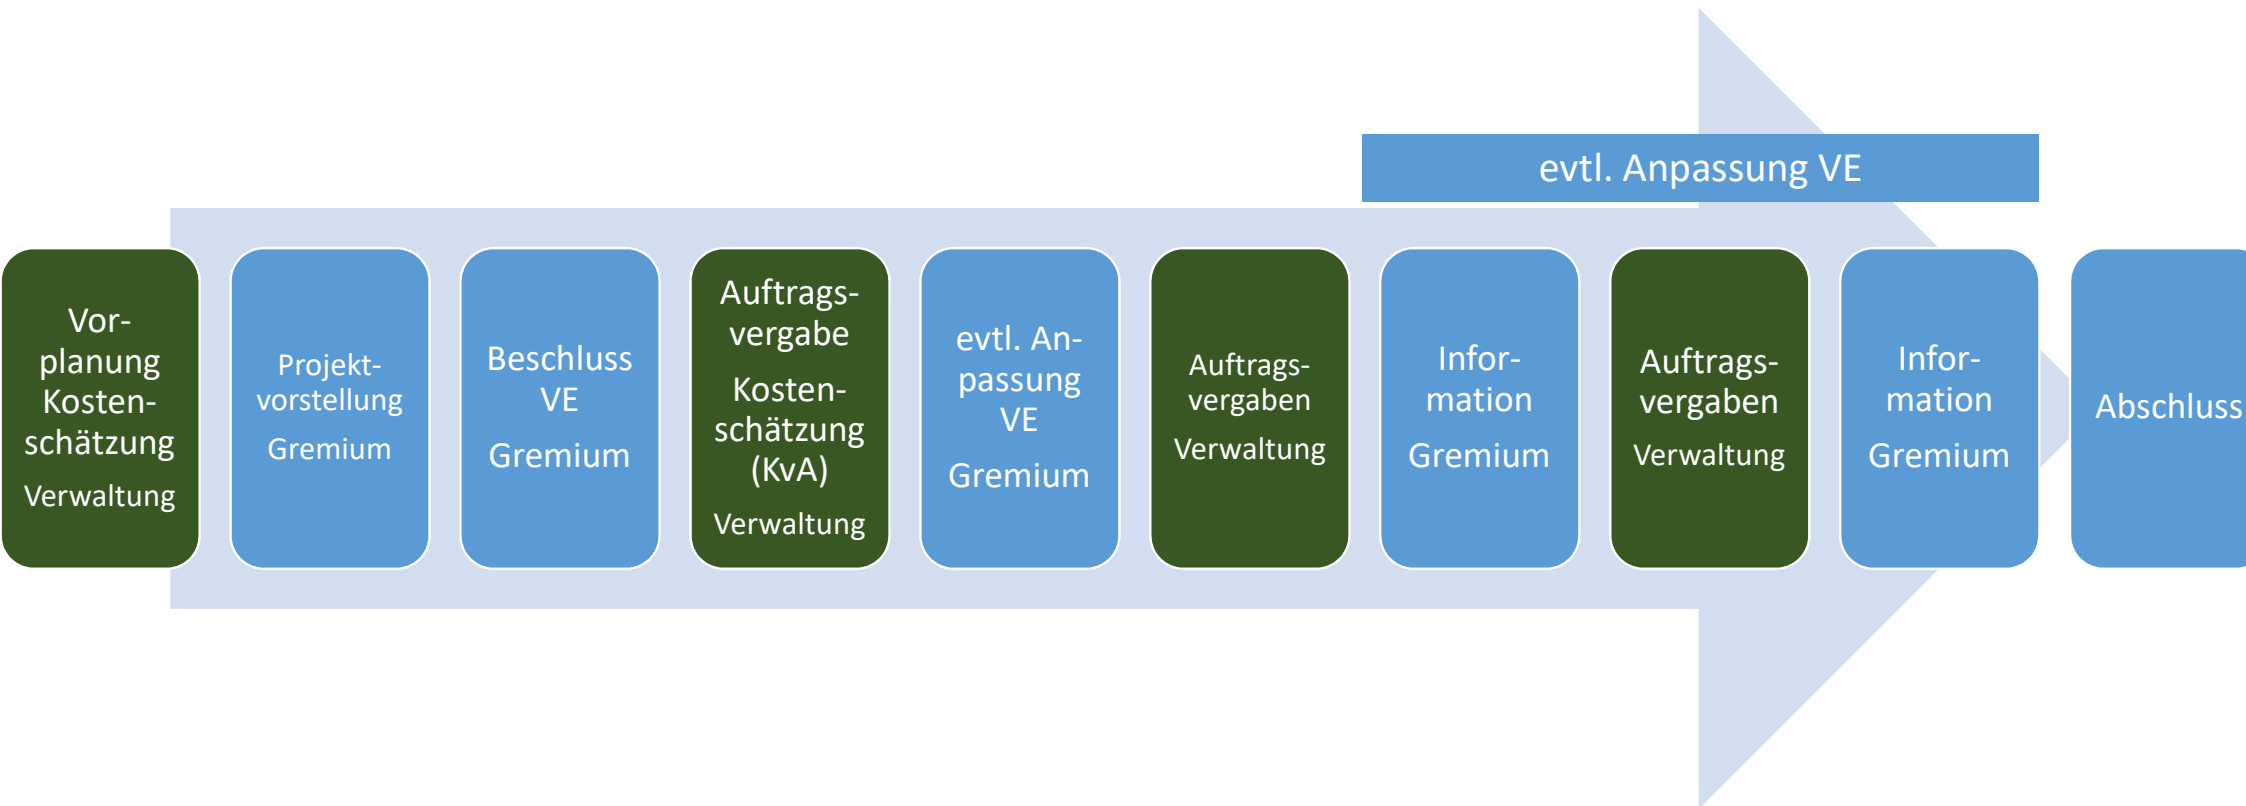

Entscheidungsmöglichkeiten des Rates

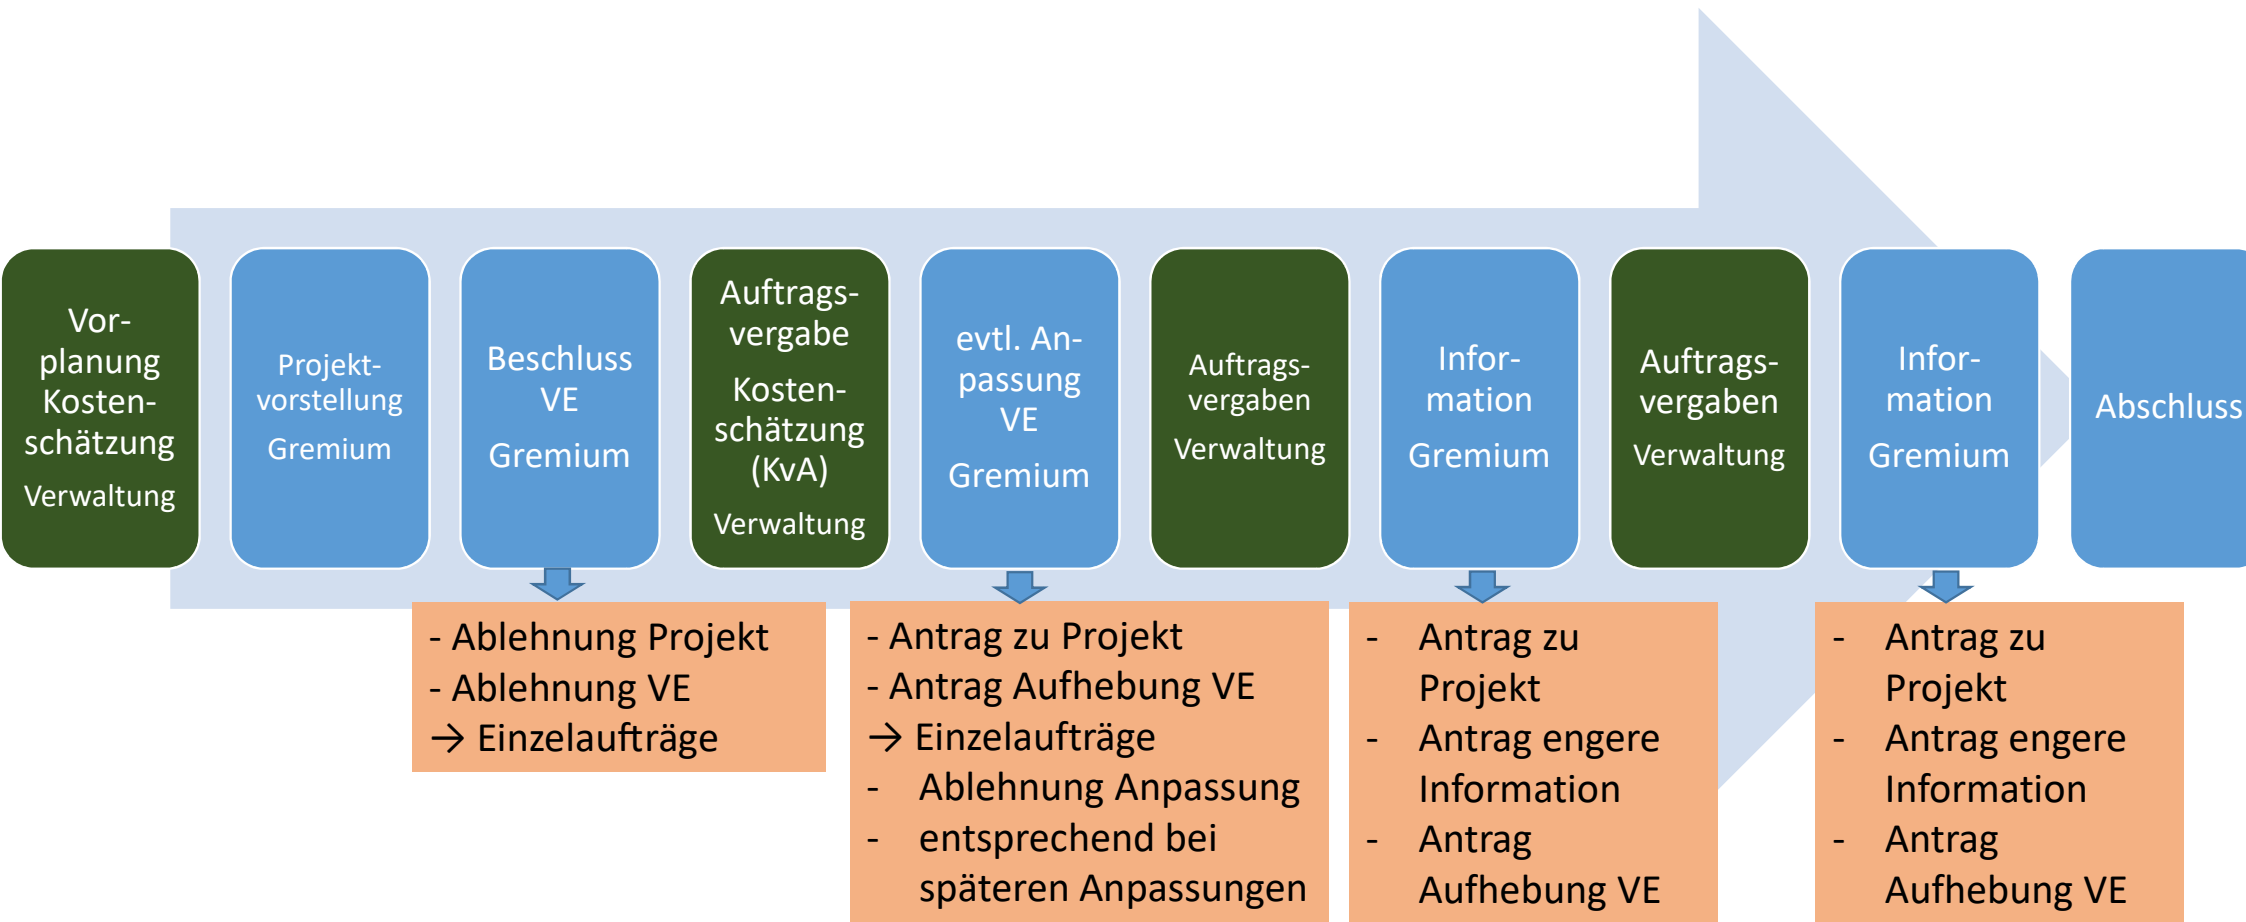

Information des Gremiums

Fortlaufende Liste Auftragsvergaben je Projekt mit:

- Anzahl Bieter
- Beauftragte Firma
- Auftragskosten
- Vergleich Kostenschätzung / Einzelgewerk
- Verhältnis Gesamtkostenschätzung

Information über im Wege der Vergabeermächtigung erteilten Aufträge

Maßnahme: Bau einer Musterschule

Kostenschätzung: 13.637.953,09 €

Anzahl der Gewerke: 65

Stand: 30.09.2022 (neue Aufträge sind **fett** markiert)

Lfd. Nr.	Los	Gewerke	Anzahl Bieter	Beauftragte Firma	Kosten	Vergleich Kosten-schätzung / einzelnes Gewerk	Vergleich zur Gesamt-kosten-schätzung
1	08	Innenausbau	6	Fa. Mustermann, Pirmasens	1.256.452,23 €	+ 3 %	+ 0,7 %
2	03	Fensterbau	2	Fa. Müller-Meier, Kaiserslautern	656.777,19 €	- 11 %	- 1,1 %
3	06	Möbel	4	Fa. Möbelexperte, Landau	126.888,79 €	+ 2 %	-0,6 %
4							

Vorteile

- **Für Rat:**

- Überblick Gesamtprojekt
- ständige umfassende Information
- jederzeitige Eingriffsmöglichkeit (Fraktionsanträge)
- Weniger Eilentscheidungen
- schlankere Sitzungen

- **Für Öffentlichkeit:**

- Transparenz durch Presse und Ratsinformationssystem (Projektstand)

- **Für Verwaltung:**

- Flexibilität
- Unabhängigkeit von Ratsterminen

- **Vorteil für alle:**

- Beschleunigung Bauablauf

Weiterer zeitlicher Ablauf

- Vorberatung Stadtrat 18.07.22
- weiterer Abstimmungsbedarf? HA am 19.09.22
- Beschluss erst im Stadtrat 26.09.22

VIELEN DANK
